Evidencia

Ceremonias Scrum

VDI · Verificación de identidad · Sprints 1 a 4



BANCO TANGAMANDAPIO

CONFIANZA QUE NOS UNE, FUTURO QUE CONSTRUIMOS

Presentado por: **Alambres Ágiles**

1 de octubre al 2 de noviembre de 2026

Ing. Juliana Ceballos

Contenido

1 El equipo y el producto

2 Sprint 1

3 Sprint 2

4 Sprint 3 y talleres

5 Sprint 4 y cierre

6 Dailys y aprendizajes

Alambres Ágiles

El equipo y el producto

Meta de producto

Verificar la identidad de una persona que abre una cuenta desde el teléfono y darle a la consola del banco un score de riesgo explicable.

Fernando Martínez
Scrum Master

Víctor López
Product Owner

Alan De Sedas
Developer

Nayeli Santacruz
QA

Evidencia tomada de Confluence, el tablero de Jira, el historial del repositorio y los ADR.



Cuatro sprints cortos

Una meta, cuatro sprints

Sprint 1

2 al 9 de octubre

Esqueleto caminante: captura de señales, perfil declarado, consola e infraestructura.

5 historias · 25 subtareas

Sprint 2

9 al 18 de octubre

Datos y DUI desde la app; la consola muestra un score de riesgo único y explicable.

5 historias · QA 30 de 32

Sprint 3

19 al 26 de octubre

RNPN y prueba de vida; la consola detiene solicitudes de alto riesgo con un umbral configurable.

5 historias entregadas

Sprint 4

27 al 31 de octubre

Pagar la deuda técnica; firma electrónica, expediente, retención y contraste con el perfil.

Productos pausados por el PO

1 de octubre al 2 de noviembre

Ceremonias registradas

Fecha	Ceremonia
2 oct	Planificación del Sprint 1
8 oct	Planificación del Sprint 2
9 oct	Revisión (QA) y retro del Sprint 1
16 oct	Revisión (QA) del Sprint 2
18 oct	Retro Sprint 2 y planificación Sprint 3
20 oct	Taller de arquitectura (ADR 0001–0004)

Fecha	Ceremonia
21 oct	Taller de deuda técnica (ADR 0005)
26 oct	Retro Sprint 3 y planificación Sprint 4
28 oct	Refinamiento del Sprint 4
28–31 oct	Revisión (QA) del Sprint 4
30 oct	Decisión del PO: pausar productos
2 nov	Cierre del Sprint 4 y del tablero

Además: 22 dailys, una por día hábil del 1 de octubre al 2 de noviembre.

2 al 9 de octubre · 1 semana

Sprint 1

Objetivo del sprint

Esqueleto caminante: captura de señales, perfil declarado, consola e infraestructura (VDI-12, 23, 24, 25, 37, 38 y 39).

Resultado

5 historias entregadas y 25 subtareas. QA: 45 casos en la última ronda; 34 pasaron, 10 fallaron y 1 quedó pendiente (11 defectos en total).

Ceremonias

Planificación: 2 oct

Revisión: 8 y 9 oct

Retrospectiva: 9 oct

Dailys: 6 (1 al 9 oct)

Planificación · 2 de octubre · los 4 integrantes

Planificación del Sprint 1

Compromiso

- Cinco historias: VDI-12, 23, 24, 25 y 37, en subtareas por componente (backend, consola y móvil).
- Dos tareas de infraestructura: VDI-38 y VDI-39 (ambientes y despliegue).

Acuerdos de trabajo del equipo

- Una rama y un PR por tarea, revisado por el Scrum Master (Fernando) y QA (Nayeli) antes de entrar a main (Definition of Done).
- Código en inglés, salvo los textos que ve el usuario; cobertura mínima de pruebas definida en la DoD.
- Trabajo conjunto los miércoles de 10:15 a 12:15 en el Centro de Conocimiento; respuesta en máximo 2 horas en días hábiles.



Redactando los acuerdos del equipo

Revisión · 8 y 9 de octubre

Revisión del Sprint 1

45

casos de QA en Dev (última ronda, 9 oct)

34

pasaron

10

fallaron · 1 quedó pendiente

5/5

historias entregadas, más 2 de infraestructura

Dos rondas de QA

Primera ronda: 41 casos (30 pasaron, 11 fallaron). Se registraron 11 defectos, sobre todo en validación de caracteres, cierre de sesión y ubicación.

Al Sprint 2

Los defectos VDI-71 a VDI-76 entraron en la planificación siguiente. En total se cerraron 25 subtareas.

Retrospectiva del Sprint 1

Empezar a hacer

- Plan de pruebas antes del sprint, para aplicar TDD.
- Criterios y casos de QA al inicio de cada historia.
- Probar casos raros por campo y revisar el contrato del API.
- Registrar cada defecto con captura el mismo día.
- Acordar las convenciones el primer día.

Dejar de hacer

- Dejar el trabajo intensivo para el miércoles.
- Juntar historias en una rama y PR (VDI-79 y 80).
- Dar por hecha una tarea sin verla en Dev.
- Pedir cambios sin decir a qué rama van.
- Aceptarse PR propios y dejar ramas olvidadas.

Seguir haciendo

- IA para el prototipo, con revisión propia.
- 70 % de cobertura (JaCoCo), Sonar y Azure gratis.
- Un PR por tarea, fallas en Jira y QA cruzado.
- Revisar capturas en el emulador antes del PR.
- Ayudarse y confiar para señalar errores.

✓ **Acciones:** prototipo del Sprint 2 (cumplida, publicado el 9 oct) · estimación del Sprint 2 (cumplida, el 8 oct) · una tarea pasa a «Finalizada» solo cuando QA la verifica en Dev.

Dailys del Sprint 1

Jueves 1 oct · previo al sprint

Dejar el tablero listo para el Sprint 1.

Avances: Víctor dejó Jira, el repositorio, apps web y móvil, CI/CD para Dev y QA y dominios.

Preocupaciones: el banco responde tarde; la plataforma solo admite Node 18, 20 o 22 (se fijó 22).

Acuerdos: en el tablero solo va el Sprint 1; cada tarea indica quién la hace.

Lunes 5 oct

Repartir el trabajo y arrancar app y consola.

Avances: Nayeli, registro de ingresos; Fernando, diseños de consola; Víctor, Spring Boot, PostgreSQL y Flyway; Alan, base de datos y semillas.

Preocupaciones: Fernando necesitaba contexto; dudas de Alan con las migraciones.

Acuerdos: tareas en In Progress, una rama por tarea y revisión cruzada Alan–Nayeli.

Martes 6 oct

Conectar la app con el API real.

Avances: app conectada al API; consola con filtros y paginación; Swagger, auth y OpenAPI; entidades y servicios.

Preocupaciones: «Movimiento esperado» pedía monto libre y el backend usa rangos; faltan subtareas móviles y el documento de la UIF.

Acuerdos: ordenar la arquitectura Java; Fernando prueba Android con el README.

Dailys del Sprint 1

Miércoles 7 oct

Ordenar ramas, revisiones y pruebas.

Avances: CI con SonarQube Cloud; marca y código en inglés; login; casos de prueba en Confluence.

Preocupaciones: un PR sin revisión; PR con español en el código; alertas con datos fijos.

Acuerdos: nadie fusiona su propio PR; main integra, dev lo prueba QA y QA lo revisa la docente.

Jueves 8 oct

Validar lo hecho y repartir las pruebas.

Avances: contraseñas por rol; ubicación por IP (PR #38); propuesta del Sprint 2 y pruebas por votación.

Preocupaciones: se desplegó a QA sin validar; ramas sin PR; DUI repetido sobrescribe datos.

Acuerdos: a QA solo lo validado; APK por correo; sin scroll horizontal en tablas.

Viernes 9 oct · cierre

Cerrar el Sprint 1 y dejar listo el 2.

Avances: QA en Dev: 34 de 45 casos pasaron; despliegue a QA; prototipo del Sprint 2 publicado.

Preocupaciones: faltaban estimaciones y criterios; el defecto de DUI duplicado seguía en revisión.

Acuerdos: datos serios en QA; adelantar el Sprint 2; retro ese mismo día.

9 al 18 de octubre

Sprint 2

Objetivo del sprint

La persona registra sus datos personales y su DUI desde la app, y la consola muestra un score de riesgo único que combina las señales y explica cuánto aportó cada una.

Resultado

5 historias entregadas. QA: 32 casos, 30 pasaron y 2 fallaron; los defectos se corrigieron dentro del sprint.

Ceremonias

Planificación: 8 oct (noche)

Revisión QA: 15 y 16 oct

Retrospectiva: 18 oct

Dailys: 5 (12 al 16 oct)

Planificación · 8 de octubre (noche) · los 4 integrantes

Historias comprometidas

Historia	Nombre	Talla	Por qué entra
VDI-10	Registro de documento de identidad	M	Parte del esqueleto caminante; de ella dependen VDI-17 y VDI-2.
VDI-2	Motor de cálculo del score, versión (a)	M	Es la propuesta de valor: ninguna señal aprueba ni deniega por sí sola.
VDI-22	Registro de información personal	M	Base del expediente KYC; falta guardar a medias y el sustento normativo.
VDI-3	Perfil transaccional declarado	S	Solo falta el versionado del perfil.
VDI-34	Aviso de privacidad para la telemetría	S	Casi sin código, pero bloquea que VDI-12 salga a producción; depende de Legal.

Tallas: S = 1, M = 2, L = 3. El objetivo del sprint está en la diapositiva anterior.

Decisiones, capacidad y alcance

#	Decisión pendiente antes de arrancar	Afecta a	Quién decide
1	OCR en el teléfono (gratis) o en la nube (más preciso)	VDI-10	Equipo
2	Qué dispara una versión nueva del perfil declarado	VDI-3	Product Owner
3	Cuánto pesa cada señal en el score	VDI-2	Líder de Conocimiento del Cliente
4	Sesión: cerrar con la pestaña o expirar por inactividad	VDI-74	Equipo
5	Cuándo pasar el código de la consola a inglés	VDI-65	Equipo

Capacidad: el Sprint 1 entregó 5 historias (7 a 8 unidades), 25 subtareas y 11 defectos; se comprometen 8 unidades y unos 25 tickets.

Defectos que entran: VDI-71 a 76 (caracteres, sesión de la consola, ciudad y ubicación).

Reparto: unas 6 tareas por persona; backend Víctor y Alan, móvil Nayeli, consola Fernando.

Fuera del sprint: VDI-11, 13, 18 y todo lo sugerido para el Sprint 3 o después.

Si sobra tiempo: RNPN simulado (VDI-17) e investigar el proveedor de prueba de vida.

Alternativa: cambiar VDI-22 por VDI-18 si para la demo importa más cerrar el esqueleto caminante.

Revisión del Sprint 2 (QA en Dev)

30/32

casos pasaron; 2 fallaron; 0 pendientes

5/5

historias entregadas (VDI-10, 2, 22, 3 y 34)

Insumo: plan de pruebas QA del Sprint 2 (DUI, datos básicos y consola).

Grupo de casos	Casos	Pasó	Falló
Captura del DUI (CP-51 a 61)	11	10	1
Confirmación de los datos (CP-62 a 68)	6	5	1
Datos básicos, aviso y ubicación (CP-69 a 74)	6	6	0
Score y retomar (CP-75 a 77)	3	3	0
Retomar la solicitud en la app (CP-78 a 83)	6	6	0

- Los 4 defectos de la ronda (VDI-103 a 106) se corrigieron y se volvieron a probar en Dev con un iPhone 15 Pro Max; falta confirmar la cámara en otros teléfonos.
- CP-59 falló con los lados del DUI cambiados (VDI-107); CP-68, porque la consola no mostraba los datos confirmados ni la marca «Corregido» (VDI-108 y 109).
- Se quitó CP-66 (no había un DUI vencido) y de CP-80 la solicitud vencida de más de 7 días, que cubre una prueba automática.

Retrospectiva del Sprint 2

Empezar a hacer

- Un dueño de punta a punta para historias de app, API y consola.
- Probar cada tarea al llegar a Dev.
- Probar en más de un teléfono y acordar cada cuánto se fusiona a QA.
- Probar en teléfono real y simulador el primer día.

Dejar de hacer

- Juntar trabajo y despliegues al final del sprint.
- Subir a QA en bloques grandes (143 commits).
- Archivos enormes con conflictos entre PR (onboarding_flow.dart).
- Commits vagos que no se rastrean al ticket.

Seguir haciendo

- Pruebas antes que el código; un PR por tarea a main.
- CI y SonarCloud, que atraparon fallas reales.
- Contrato del API para avanzar en paralelo.
- Probar en teléfonos reales.
- ADR 1 a 5, ticket VDI en cada commit.

Acciones: la página no registró acciones. Los archivos enormes y los despliegues acumulados se retomaron como deuda técnica en el taller de 21 de octubre y en el Sprint 4 (VDI-125 y 126).

Dailys del Sprint 2

Lunes 12 oct

Arrancar el Sprint 2 y desbloquear los PR.

Avances: score de 0 a 100 y guardado a medias; pruebas de consola en el CI; captura guiada del DUI.

Preocupaciones: ningún PR pasaba el CI; rangos y puntos que no coinciden con el prototipo.

Acuerdos: incongruencias «Por confirmar» con el PO; mover tareas a In Progress.

Martes 13 oct

Reglas de validación del DUI y los nombres.

Avances: DUI con diseño del prototipo y aviso de privacidad; caracteres en nombres; contrato de reanudar.

Preocupaciones: se rechazan apóstrofo y guion (VDI-88); no hay cómo invalidar un DUI vencido.

Acuerdos: el DUI vencido no se rechaza; los merge se coordinan con Víctor.

Miércoles 14 oct

Alinear consola y backend: score y DUI.

Avances: la consola pasó de la regla R-01 al score; cámara del DUI con zoom y enfoque.

Preocupaciones: PR de Nayeli con conflictos; la cámara capturaba en oscuridad.

Acuerdos: versiones estables a Dev; arreglar el obturador; pipeline listo para la docente.

Dailys del Sprint 2

Jueves 15 oct

Reconciliar ramas para que todo llegue a main.

Avances: Alan: VDI-88, consentimiento y migración de VDI-83 renumerada. Víctor: VDI-86 adaptada al versionado del perfil. Fernando: consola con el modelo de score. Nayeli: retomar la solicitud.

Preocupaciones: la rama de VDI-86 salió de VDI-90 y no de main, así que el PR #75 nunca llegó a main; faltaba acceso de Nayeli a SonarCloud; un DUI con reflejo no se podía validar.

Acuerdos: Nayeli puede desplegar a Dev para entender el flujo (lo aprobó Víctor); la ronda de QA del Sprint 2 se registra en Confluence.

Viernes 16 oct · cierre del Sprint 2

Cerrar el Sprint 2 y pasar a QA.

Avances: Alan pasó a Fernando la consola de VDI-3 (el API ya devuelve todas las versiones del perfil). Nayeli cerró VDI-87, pendiente del merge del PR #114. Víctor: VDI-107 y VDI-109.

Preocupaciones: un DUI mal digitado lo corrigió la foto (queda la advertencia en la consola); el score siempre suma 10 puntos por «datos diferentes del DUI».

Acuerdos: última comprobación en Dev y envío a QA; quitar el sello «aprobado por Legal» y dejar solo la versión. QA: 30 de 32 casos pasaron.

19 al 26 de octubre

Sprint 3

Objetivo del sprint

La persona confirma su identidad con el RNPN y una prueba de vida, y la consola detiene las solicitudes de alto riesgo para revisarlas, con un umbral que el banco ajusta sin desplegar código.

Resultado

Entregado: RNPN simulado, prueba de vida, revisión reforzada, umbrales configurables y número único de cliente.

Ceremonias

Planificación: 18 oct (noche)

Taller de deuda técnica: 21 y 22 oct

Dailys: 6 (19 al 26 oct)

Taller de arquitectura: 20 oct

Retrospectiva: 26 oct

Planificación · 18 de octubre (noche), tras la retro del Sprint 2

Velocidad observada

	Sprint 1 (2 al 9 oct)	Sprint 2 (9 al 18 oct)
Historias comprometidas / terminadas	5 / 5	5 / 5
Subtareas cerradas	26	21
Defectos y tareas extra cerrados	7	7 dentro del sprint y 7 fuera
Tamaño aproximado (S = 3, M = 5, L = 8)	≈ 22 puntos	≈ 26 puntos

Velocidad estable

5 historias por sprint y todo lo comprometido terminado en los dos.

20–25 % para defectos

Los defectos de QA se llevan cerca de un tercio del esfuerzo.

Jira actualizado

VDI-107, 108 y 109 a Done; sus PR #117, #121 y #119 ya estaban en main.

Planificación · 18 de octubre · los 4 integrantes

Historias comprometidas

Historia	Nombre	Talla	Por qué entra
VDI-17	Cotejo contra el RNPN	M	Estaba sugerida para el Sprint 2 y no entró; activa una señal del score.
VDI-11	Prueba de vida	L	La de mayor valor antifraude y parte del esqueleto caminante.
VDI-18	Detener solicitudes de alto riesgo y bitácora auditable	M	Hace que el score sirva para decidir.
VDI-33	Configuración dinámica de umbrales	S	Su dependencia (VDI-2) ya está hecha y VDI-18 necesita el umbral.
VDI-27	Identificador único de cliente (fusiona VDI-26)	S	Se trabaja junto con VDI-98, que también trata de clientes duplicados.

Arrastre: VDI-98 (se puede repetir el DUI y el celular) y VDI-110 (al retomar una solicitud no se registran las señales). **Subtareas:** 13, VDI-111 a VDI-123, con descripción, criterios de «listo cuando» y notas de dependencia.

Decisiones, riesgos y responsables

Para el Product Owner (Víctor)

- **Prueba de vida:** spike el primer día; solo el plan gratis de Azure. Sin proveedor a tiempo, VDI-11 se cambia por VDI-13.
- **RNPN sin API pública:** contrato propio y servicio simulado («coincide», «no coincide», «no disponible»).
- **Score v2:** al sumar RNPN y prueba de vida hay que repartir de nuevo los pesos.
- **VDI-18, criterio 4:** guardar casos maliciosos en la lista interna depende de VDI-13; queda fuera.
- **VDI-98:** el PO decide si se puede retomar con el mismo DUI una solicitud que no terminó.
- **Fuera del sprint:** apertura de cuenta (VDI-19, 20, 21, 15 y 35), que depende de VDI-17, 11 y 18.

Responsables

Las subtareas se reasignaron y cada integrante quedó en un área distinta a la de los sprints anteriores.

- Víctor tomó móvil: VDI-112, 116 y 118.
- Fernando tomó backend: VDI-111, 117 y 122.
- 3 o 4 tareas por persona.

Taller de arquitectura ágil

ADR	Decisión	Consecuencias que el equipo reconoció
0001	Flutter para el mock del onboarding de la banca móvil.	Decisión de una vía: el mock queda en Dart; no se reutiliza si la banca real usa otra tecnología y hay que mantener Flutter, Android Studio y Xcode.
0002	PostgreSQL con JPA y Flyway como base de datos.	De dos vías gracias a JPA, pero cambiar es «relativo»: las migraciones usan SQL, funciones y triggers de PostgreSQL.
0003	Dos ambientes, Dev y QA, con las variables de entorno como único acoplamiento.	Dos ambientes que mantener; comparten base de datos y presupuesto gratuito, y QA corre con el perfil de Dev, así que no se parece a producción.
0004	Java 21 con Spring Boot; se descartó Python por las implementaciones manuales.	Arranca más lento y el entorno debe soportar la JVM; Java 21 pierde soporte principal en septiembre de 2028.

Formato del taller: contexto, decisión con la alternativa descartada, consecuencias (incluidas las negativas) y estado.

Taller de deuda técnica

Cómo se buscó

- Revisión del repositorio por componente (backend, consola y app) buscando atajos.
- Se separó la deuda consciente de la accidental con ayuda de los ADR.
- Consola: las pantallas de src/app no tienen pruebas y están fuera de la cobertura exigida.
- Los tipos del API se escribían a mano aunque existe docs/openapi.json.
- La zona horaria repetida en cinco servicios (hallazgo 5b) quedó como «si sobra tiempo».

Qué se decidió

- Los hallazgos 1, 2, 3, 4 y 8 son la deuda que sí cobra intereses.
- Se reservaron horas del Sprint 4 para pagarla, con un tope de 3 h por tarea.
- **ADR 0005 (22 oct):** aceptar la vista v_request_signals copiada en cada migración y la regla nocturna repetida en ScoreEngine.java; reescribirlas costaría ≈ 14 h.
- Se compensa con una prueba de consistencia (VDI-129, 1 h) y se revisa si se piden dos o más señales nuevas.

Retrospectiva · 26 de octubre · Start / Stop / Keep

Retrospectiva del Sprint 3

Empezar a hacer

- Correr el CI sobre el resultado de la fusión: los PR #127 y #128 pasaban solos, pero juntos rompieron main (dos migraciones V26).
- Dar más contexto y cuidar la calidad del código.

Dejar de hacer

- Copiar y pegar clases entre pantallas: la duplicación bloqueó el PR a QA.
- Hacer las dailys sin un objetivo marcado.

Seguir haciendo

- Documentar mientras se construye, con criterios de aceptación claros.
- Probar en teléfono real y coordinar entre subtareas.
- La comunicación entre todos.

✓ **Acción: un chequeo en el CI que falle si hay migraciones Flyway con versión repetida.**

Dailys del Sprint 3

Lunes 19 oct

Servicios de backend listos para móvil y consola.

Avances: prueba de vida, score v2 y umbrales (VDI-114, 115 y 120); login arreglado tras el comentario de la docente.

Preocupaciones: móvil y consola esperan los servicios de backend.

Acuerdos: backend avisa cuando estén listos; nuevos puntajes en la barra de score.

Martes 20 oct

Taller de ADR y primeras piezas del RNPN.

Avances: ADR 0001 al 0004; VDI-117, 111 y 122; migración V26 duplicada corregida.

Preocupaciones: al detener una solicitud no se crea alerta; dos migraciones V26 en main.

Acuerdos: Fernando se prepara para defender el código; Nayeli pasa a Dev al terminar.

Miércoles 21 oct

Repartir el taller de deuda y las pantallas.

Avances: revisión reforzada, espera y selfie (VDI-112, 116 y 118); partes 2 a 5 del taller por votación.

Preocupaciones: la entrega es antes de las 12 del día siguiente.

Acuerdos: tarjetas de Jira al día siguiente; la parte 5 se intercambia con el otro equipo.

Dailys del Sprint 3

Jueves 22 oct

Cerrar el taller de deuda técnica.

Avances: partes 2 y 3 revisadas contra la guía; Nayeli subió el ADR 5 en un PR.

Preocupaciones: partes 4 y 5 sin tarjetas, ADR fuera de main y horas que no cuadraban.

Acuerdos: última revisión antes de entregar; Nayeli crea las tarjetas.

Viernes 23 oct

La prueba de vida en el teléfono.

Avances: giro del reto de la selfie, ajuste de «poca luz» en iOS y guía para iPhone.

Preocupaciones: no lee con dos personas en cuadro y dice «poca luz» con buena luz.

Acuerdos: Alan sube sus cambios cuando alguien suba lo previo.

Lunes 26 oct · cierre

Retro del Sprint 3 y abrir el Sprint 4.

Avances: retro en Confluence; VDI-129, 126, 131 y 134; cliente de prueba de vida ajustado para Sonar.

Preocupaciones: el PR hacia QA falló los checks del CI.

Acuerdos: chequeo en el CI contra migraciones repetidas.

27 al 31 oct · 4 días de trabajo

Sprint 4

Objetivo del sprint

Pagar la deuda técnica que cobra intereses y cerrar firma electrónica, expediente de vinculación, retención y contraste con el perfil.

En Jira el sprint quedó creado sin meta definida; este fue el enfoque acordado en la planificación.

Resultado

En Done: firma y expediente, retención y consulta, tolerancia del perfil, listas internas, escalamiento, desenlace de casos y deuda técnica. Productos y transferencias, fuera por decisión del PO.

Ceremonias

Planificación: 26 oct

Refinamiento: 28 oct

Revisión QA: 28 al 31 oct

Decisión del PO: 30 oct

Cierre del tablero: 2 nov

Dailys: 5 (27 oct al 2 nov)

Planificación · 26 de octubre · los 4 integrantes

Planificación del Sprint 4

Criterios

- **Ventana:** 27 al 31 de octubre, 4 días de trabajo, el más corto del ciclo.
- **Áreas:** backend Víctor y Alan · consola Nayeli · móvil Fernando.
- **Capacidad:** máximo de 3 h por tarea (ADR 0005).
- **Propuesta del equipo:** pagar toda la deuda técnica pendiente (14 h) y sumar un hilo corto de funcionalidad, en lugar de todo lo sugerido.

Notas de alcance y riesgos

- VDI-15 era arrastre del Sprint 3 y bloquea a VDI-35: entran juntas.
- El resto de VDI-5, y VDI-14 y 16, al Sprint 5; VDI-4 (L) y VDI-28 a 32, fuera.
- Riesgo: Nayeli con 13 h en 4 días; si había que recortar, salía VDI-138 o VDI-127.
- VDI-26 por cerrar: su trabajo ya se entregó con VDI-122 y 123.

Alcance comprometido

Ítem	Descripción	Horas	Responsable
VDI-129	Prueba de consistencia de la regla nocturna	1	Víctor
VDI-124	Filtro de estados de la consola desde format.ts	2	Nayeli
VDI-128	Quitar las URL de respaldo de Dev y QA (backend, consola y app)	1 c/u	Alan, Nayeli y Fernando
VDI-126	Primer corte de ConsoleRequestService	3	Víctor
VDI-127	Tipos del detalle de solicitud desde openapi.json	3	Nayeli
VDI-125	Primer corte de onboarding_flow.dart	3	Fernando
VDI-15	Firma electrónica y expediente (VDI-130 a 133)	3, 3, 3 y 2	Alan, Víctor, Fernando y Nayeli
VDI-35	Retención y consulta del expediente (VDI-134 a 136)	2, 3 y 3	Víctor, Alan y Nayeli
VDI-5	Contraste con el perfil: tolerancia configurable (VDI-137 y 138)	3 y 2	Alan y Nayeli

Refinamiento: ajuste de alcance

Motivo y estado

- El sprint avanzaba mejor de lo previsto y el equipo quiso aprovechar la capacidad libre.
- 16 de 21 issues en IN TESTING; solo faltaban VDI-132 y 141 (móvil) y las historias madre.
- El backend de Víctor y Alan y la consola de Nayeli ya habían terminado.
- Cuello de botella: la revisión manual del Scrum Master (Fernando) y QA (Nayeli).

Lo que se agregó

- VDI-142: modelo de listas internas (de VDI-13), Víctor, 3 h.
- VDI-143: escalar a videollamada o agencia (de VDI-36), Alan, 3 h.
- VDI-144: desenlace de un caso (de VDI-28), con VDI-145 en consola (Nayeli).
- VDI-19, 20 y 21 (productos) y VDI-14 (transferencias), con VDI-146 a 154.
- Quedaron fuera VDI-4, VDI-16 y las alertas (VDI-29 a 32).

Por confirmar con el PO: qué productos hay, la regla de elegibilidad y que la confirmación solo muestre los últimos 4 dígitos. **Carga:** Fernando quedaba con 9 h nuevas, además de VDI-132 y 141.

Revisión del Sprint 4 (QA en Dev)

58/62

casos pasaron al cierre (30 oct)

1 · 3

caso falló · casos pendientes

13

reglas cumplidas

Pruebas manuales hechas

- Score con un nombre distinto al del DUI: «Documento de identidad» sube a 9 de 15 puntos.
- Textos del RNPN en español con el resultado «Coincide».
- URL del API por --dart-define (VDI-141).

Omitidas y pendientes

- Omitidas: RNPN «No coincide» y «No disponible», que necesitan una solicitud nueva con DUI de prueba.
- Pendiente en dispositivo: VDI-132 completo y CP-135.

Insumos: plan de pruebas QA del Sprint 4, resultados en Dev del 28 de octubre y la guía de pruebas manuales (docs/pruebas-sprint-4-fernando.md).

Lo que dejó la revisión del Sprint 4

Hallazgos de QA atendidos

ID	Hallazgo
B-5	Tipo ArchivedDossier escrito a mano
B-8	Puntaje por nombres distintos
B-11	openapi.d.ts desactualizado
B-12	Textos de firma y desenlace en inglés
B-14	Fila Ciudad sin evaluar
B-16	El detalle de una solicitud daba error 500 en Dev

ADR y mejoras (31 de octubre)

- **ADR 0007:** modelo de score versionado, sin Ciudad y con pesos que suman 100.
- **ADR 0008:** una migración aplicada no se revierte y el enum de Java conserva todos los valores de la base.
- **ADR 0009:** los tipos de la consola salen del contrato OpenAPI.
- La app recuerda la solicitud enviada y muestra su número y estado al abrirse.
- Se eliminó código sin uso en backend, consola y app.

Decisión del Product Owner

Víctor, Product Owner · comunicada a los 4 integrantes

Pausar todo lo relacionado con producto y solicitud de productos, y priorizar la verificación de identidad, que es el núcleo del proyecto.

Cómo se aplicó

- Se revirtieron de main VDI-146, 147, 148 y 150 con los PR #202 y #203; el PR #199 no se despliega.
- Las migraciones V39 y V41 se conservaron: ya corrieron en Dev y Flyway no admite quitarlas. Se recupera con un revert.

Consecuencia y criterio

- El evento «Producto elegido» quedó sin valor en el enum de Java: se corrigió en el PR #204 (ADR 0008).
- Lo que está hecho es lo que se queda; con cuatro sprints se recorta alcance antes que calidad.

Cierre del tablero

Objetivo: dejar el tablero consistente con lo que el producto muestra el día de la Feria.

Pasaron a Done

Historias VDI-5, 13, 15, 28, 35, 36 y 128; subtareas VDI-126, 129, 132, 134, 137, 141, 142, 143 y 144 (en IN TESTING con su PR ya en main).

Ya estaban en Done

VDI-124, 125, 127, 130, 131, 133, 135, 136, 138, 139, 140 y 145.

Salen al backlog

VDI-14 (transferencias), VDI-19, 20 y 21 (productos) y sus subtareas VDI-146 a 154, incluido lo revertido (146, 147, 148 y 150).

Ningún issue quedó sin terminar en el Sprint 4.



El equipo con el repositorio verificacion-online

Dailys del Sprint 4

Martes 27 oct

Pagar la deuda «pagar ya» y encaminar la firma.

Avances: VDI-140, 127, 124, 138 y 125; URL de respaldo del backend y expediente.

Preocupaciones: VDI-131 nunca llegó a main (PR #158 a otra rama; se corrigió con el PR #172).

Acuerdos: los servicios deben estar en Dev; Alan los pasa al terminar.

Miércoles 28 oct

Pantallas de consola y capacidad libre.

Avances: todo el sprint en Dev; VDI-133, 136, 142, 144, 132 y 141; se hizo el refinamiento.

Preocupaciones: cuatro PR de Nayeli esperaban revisión.

Acuerdos: un documento que muestre las pruebas; tareas nuevas internas de VDI-15 y 128.

Jueves 29 oct

Probar en móvil lo ya desplegado.

Avances: Víctor dejó listo el despliegue para probar en móvil; Nayeli: VDI-145 y VDI-150.

Preocupaciones: sin observaciones.

Acuerdos: probar en móvil con lo de Dev.

Dailys del Sprint 4

Viernes 30 oct

Responder a la decisión del PO sin romper main.

Avances: pruebas en Confluence (58 de 62 casos, 1 falló, 3 pendientes, 13 reglas cumplidas); se revirtió lo de productos (PR #202 y #203); Víctor pidió quitar Ciudad del score.

Preocupaciones: dos ramas de productos en Dev; no se detecta si DUI y selfie son la misma persona; sin Ciudad el score no suma 100 y hay que reajustar umbrales; defectos pendientes de Alan y Víctor.

Acuerdos: se paraliza lo de productos; aceptar las reversiones en orden; listas a «próximamente»; código sin uso y ADR ese día; Alan indica cómo provocar una revisión reforzada en Dev.

Lunes 2 nov · cierre del Sprint 4

Cerrar el fin de semana y preparar la Feria.

Avances: se quitó Ciudad y el score vuelve a sumar 100; Nayeli agregó los ADR 0007, 0008 y 0009; Víctor corrigió textos en español; Fernando limpió código sin uso (flutter analyze y knip). Tablero de Jira cerrado.

Preocupaciones: completar la evidencia del proceso de la rúbrica (A4): actas, backlog y ADR; preguntas orales del jueves sobre Scrum y sobre el código.

Acuerdos: reunirse para definir la presentación y su apoyo visual; cada integrante estudia el código y las decisiones.


1 de octubre al 2 de noviembre

Una daily por día hábil

22 actas de daily, cada una con su objetivo del día.

- ☆ **Objetivo del día**
- ✓ **Avances**
- ⚠ **Preocupaciones**
- 💬 **Sugerencias y acuerdos**

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4
6 dailys	5 dailys	6 dailys	5 dailys

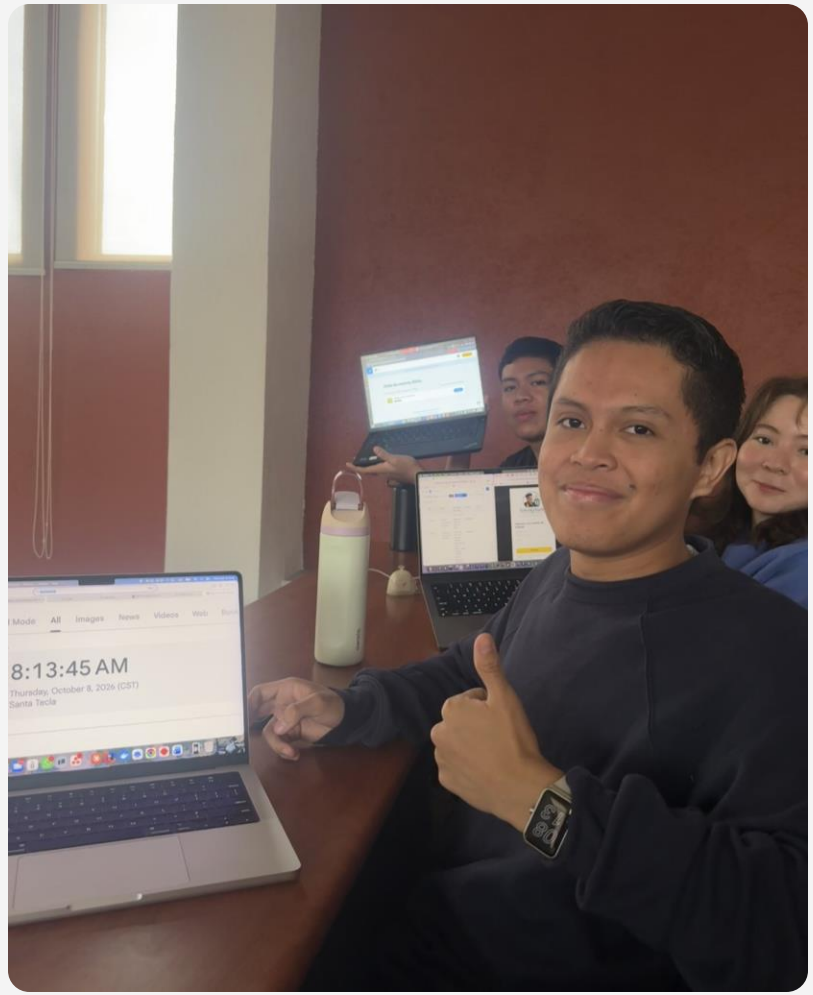

Daily del jueves 8 de octubre, 8:13 a. m.

Lo que aprendimos

Recortamos alcance antes que calidad.

Probar en Dev

Una tarea está terminada cuando QA la ve funcionando, no antes.

Integrar seguido

Una rama y un PR por tarea, revisado por otra persona y fusionado a main.

Dejar rastro

Actas, Jira y ADR explican cada decisión del ciclo.

¡Gracias!

¿Preguntas sobre el proceso o el código?

Alambres Ágiles

Alan De Sedas · Víctor López · Fernando Martínez · Nayeli Santacruz

